

REALIZAÇÃO



Project
Management
Institute
Goiás, Brazil

19 SGPL

SEMINÁRIO EM GESTÃO, PROJETOS E
LIDERANÇA

PATROCINADOR



Project
Management
Institute



REALIZAÇÃO



Project
Management
Institute
Goiás, Brazil

PMBOK® 8:

Menos processo,
Mais inteligência
Todo o **VALOR**

PATROCINADOR



Project
Management
Institute










Menos processo,
PMBOK® 8 : Mais inteligência
Todo o **VALOR**

Anderson Sales

Anderson Sales



JUMP
PROFESSIONAL TRAINING

DESDE
2020.



JUMP
PROFESSIONAL TRAINING

NOSSOS
Números.
DESDE 2020

60 Turmas DA

63 Turmas PMP

+2200 Alunos

17 Países

NOSSA Avaliação.



Jump Educação e Consultoria LTDA
São Paulo, São Paulo, Brazil

Course Focus:

PMP PREPARATION COURSE

CERTIFIED ASSOCIATE IN PROJECT MANAGEMENT (CAPM)® OFFICIAL EXAM PREP COURSE

PMI AGILE CERTIFIED PRACTITIONER (PMI-ACP)

DISCIPLINED AGILE FOUNDATIONS: APPROACHES FOR TEAM AGILITY

DISCIPLINED AGILE LEADERSHIP: VALUE DELIVERY FOR ENTERPRISE AGILITY

PMI PMO CERTIFIED PROFESSIONAL PMI® CAPM® TO PMP® ESSENTIALS COURSE

Rating: ★★★★★

203 Surveys Complete

*Mais avaliado e bem avaliado entre os ATPs brasileiros



NOSSOS Treinamento



S.

PMP®

PMI-ACP®

CAPM®

PMI-PMOCP®





Lançamento PMI Global Summit

Digital: 13/11/2025

Papel (EN): Janeiro 2026

Papel (PT): Sem previsão



Global Summit 2025

MOO
MORE, Together





Agile

Artificial
Intelligence

Change
Management

Social
Impact

Product
Management

PMOs

Giga
Projects

Sustainability

A woman with long dreadlocks stands in the center of a city sidewalk. She is wearing a light purple t-shirt, a green button-down shirt, and tan trousers. The background is a blurred city street with other pedestrians and trees. The text 'Guida PMBOK®' is overlaid in white, bold font across the center of the image.

Guida PMBOK®

Evolução

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
(PMI)

**PROJECT MANAGEMENT
BODY OF KNOWLEDGE
(PMBOK)**

by
PMI Standards Committee

Approved by the PMI Board of Directors
March 28, 1987

Effective for certification and educational program reviews
September 1, 1987




P.O. Box 43
Drexel Hill, PA 19026

© 1987 Project Management Institute
All rights reserved. May not be reproduced in whole or in part
without the express written permission of the Project Management Institute


Guia PMBOK® Antes de 1996

Evolução

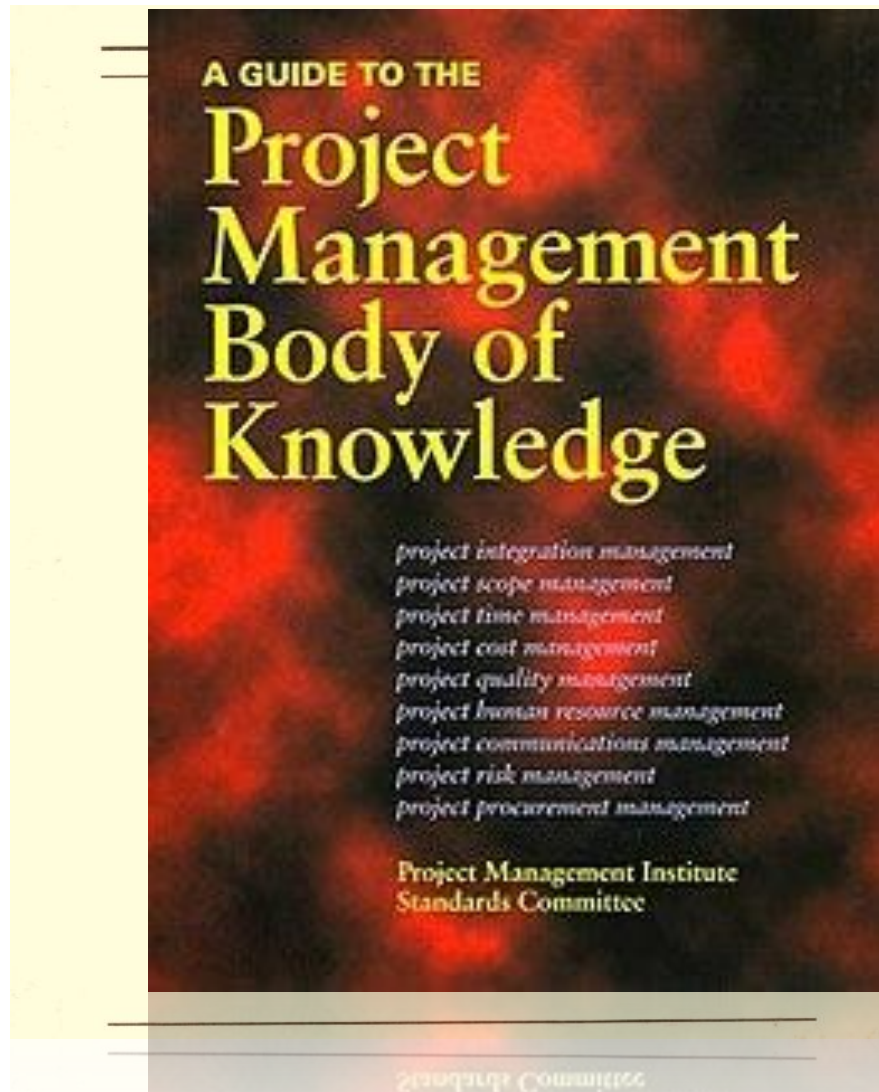


Guia PMBOK® 1996

Evolução

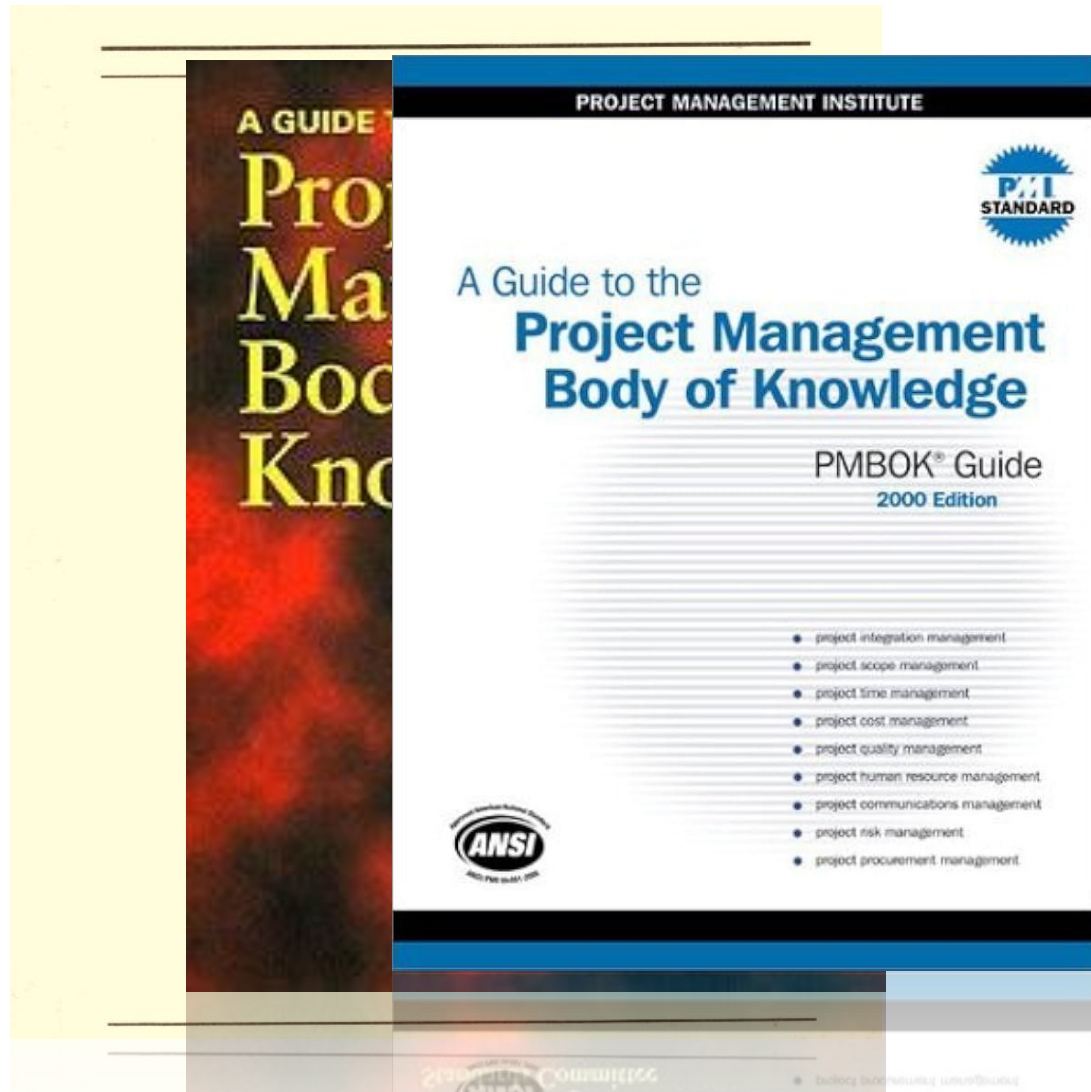


Guia PMBOK® 2ª Edição 2000

Evolução

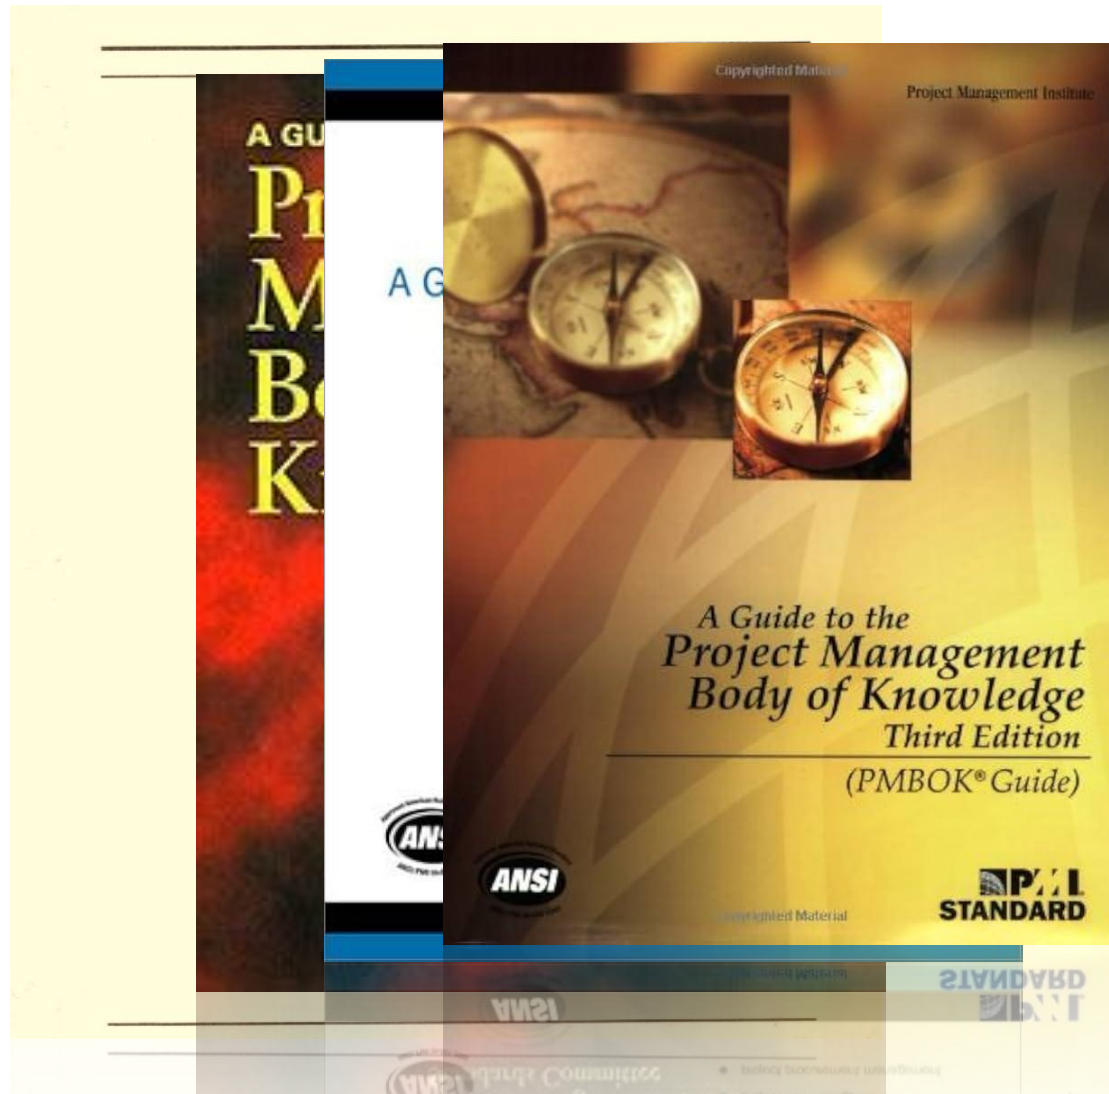

Guia PMBOK® 3ª Edição 2004

Evolução

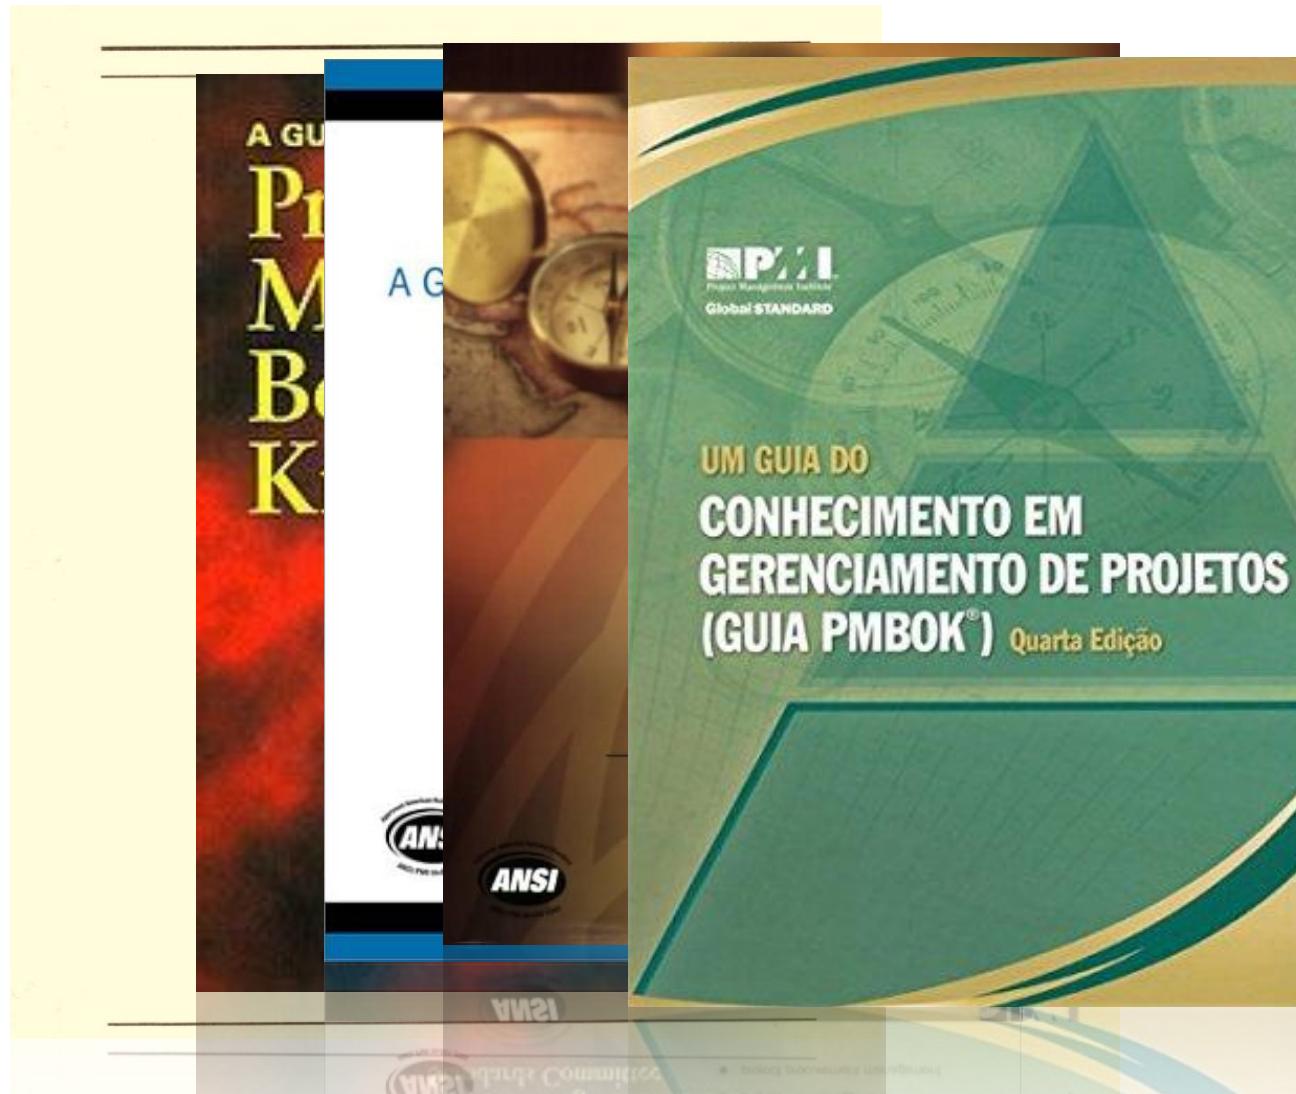

Guia PMBOK®
4ª Edição
2008

Evolução





Guia PMBOK® 5ª Edição 2013

Evolução






Guia PMBOK®
6ª Edição
2017

Evolução

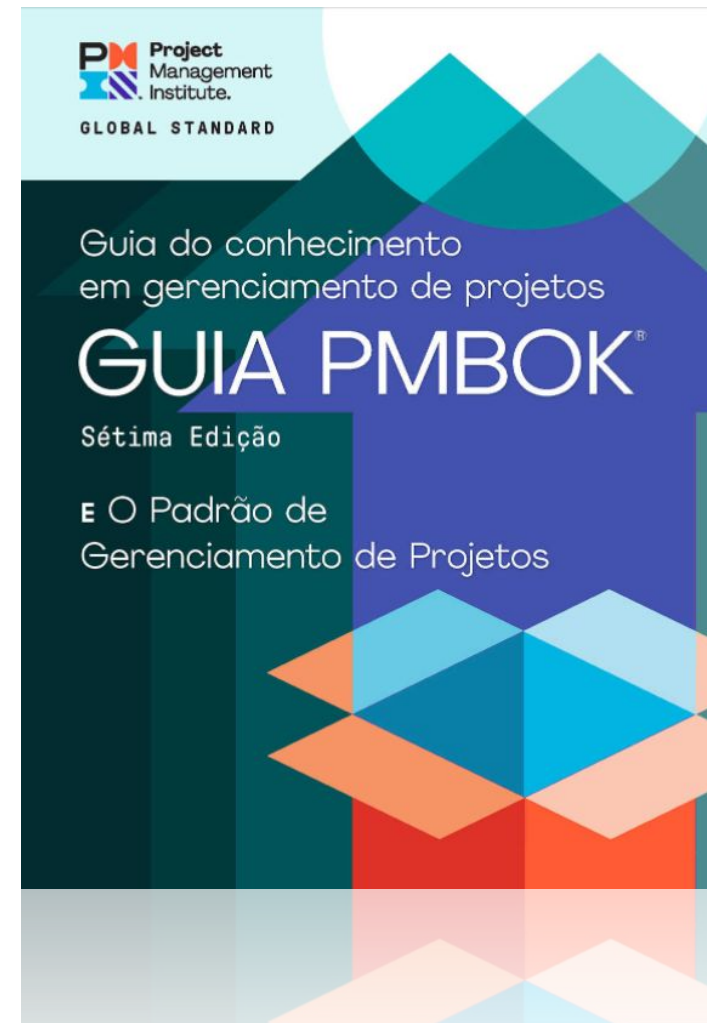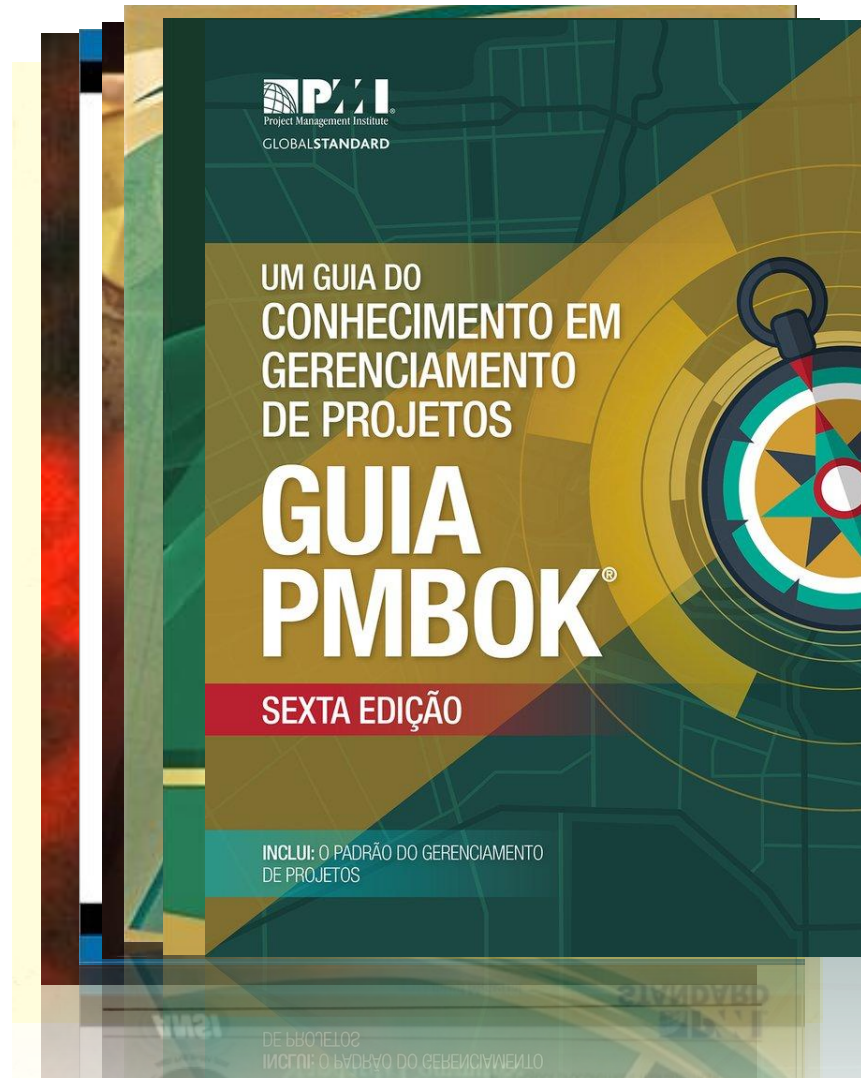

**Guia
PMBOK 7**
2021




Evolução

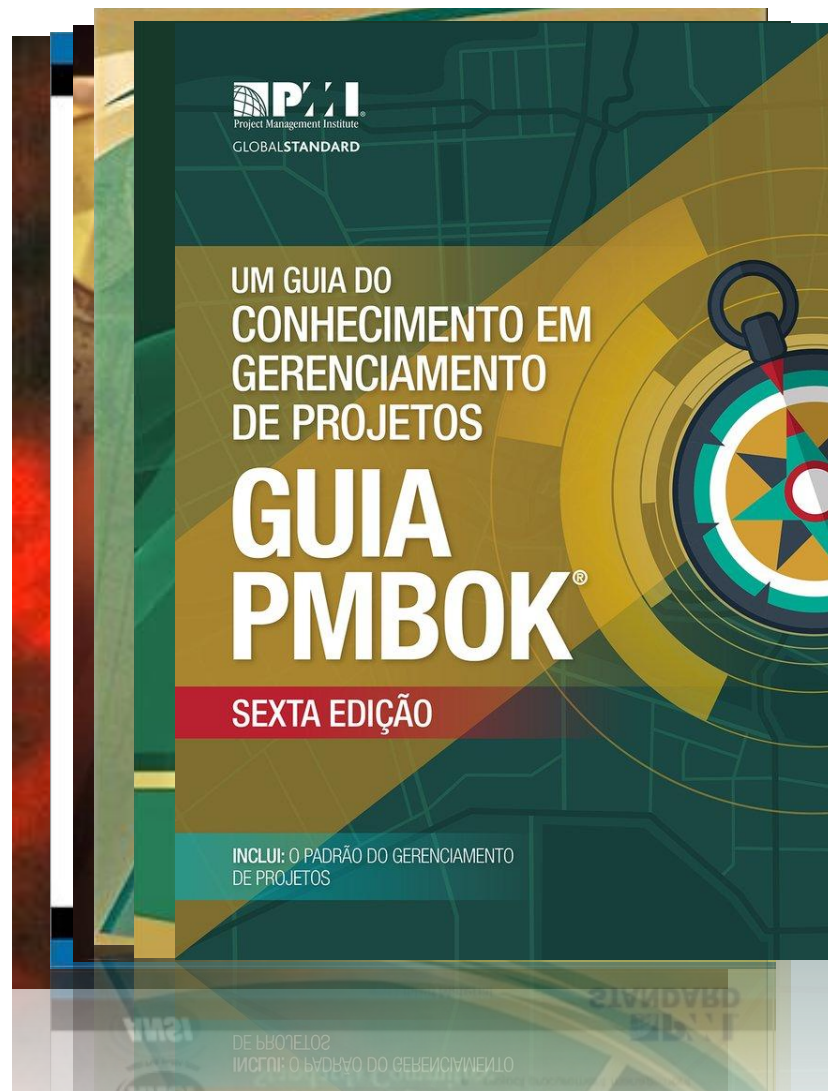

**Guia
PMBOK 7
2021**


**Guia
PGPG
2022**

Evolução

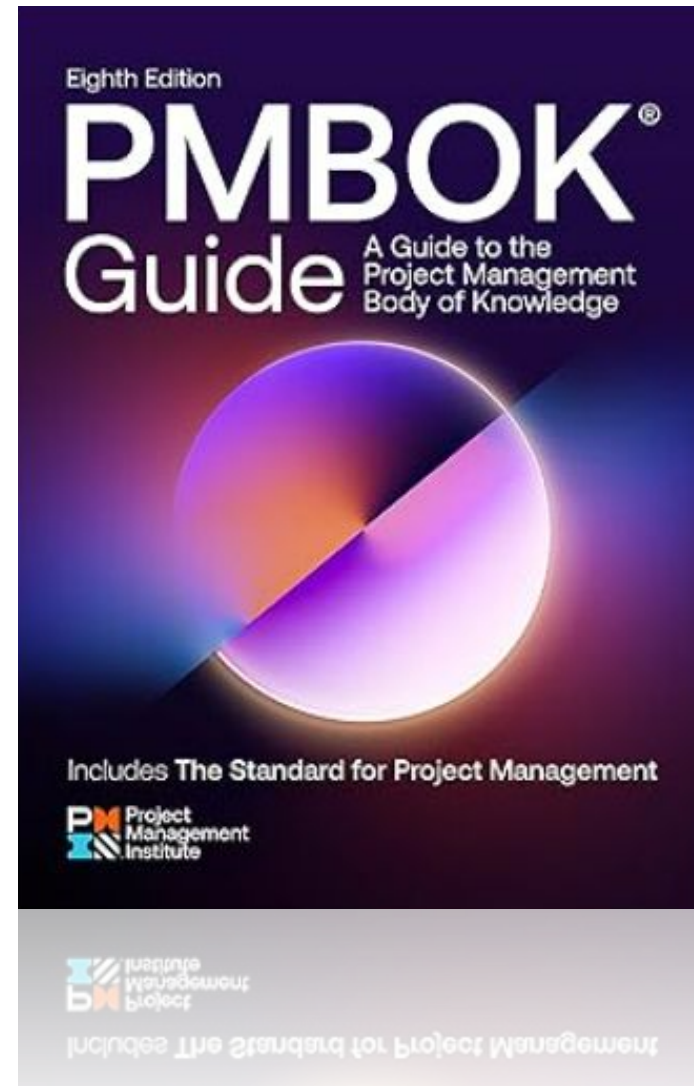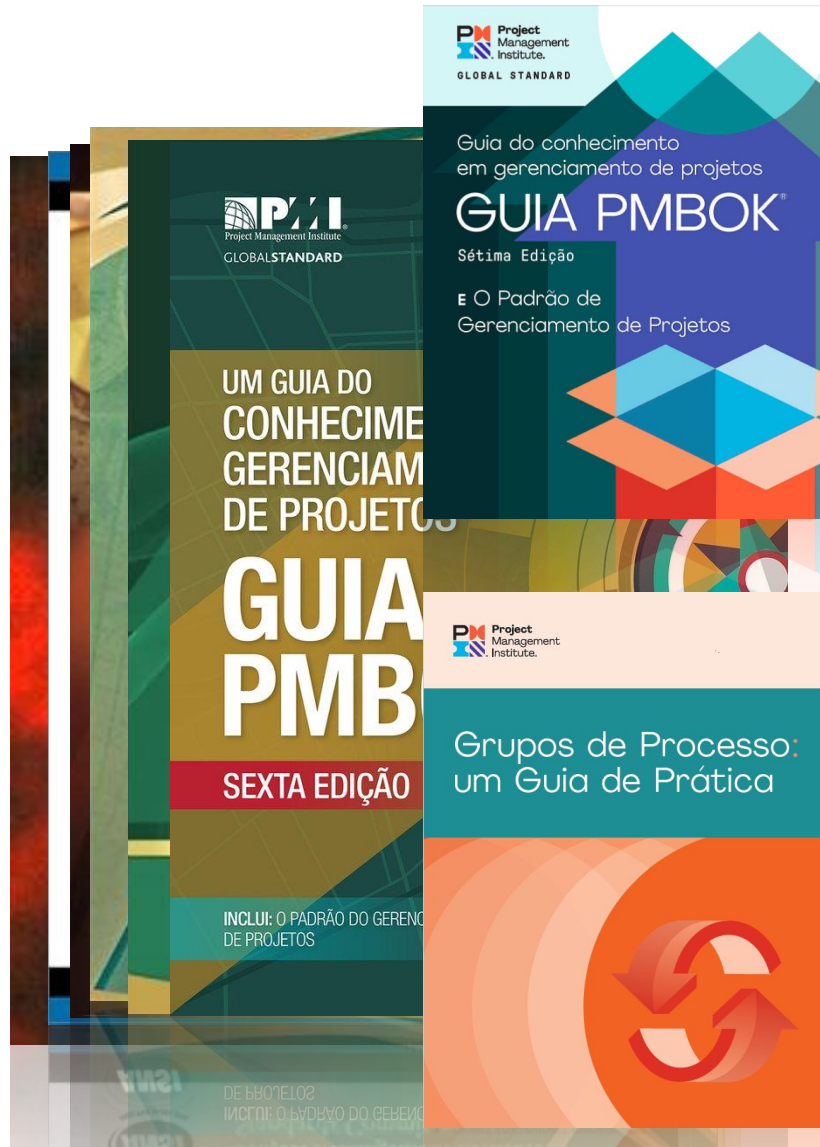


Guia
PMBOK 8

Definições de Projeto PMBOK 6 – 7 – 8

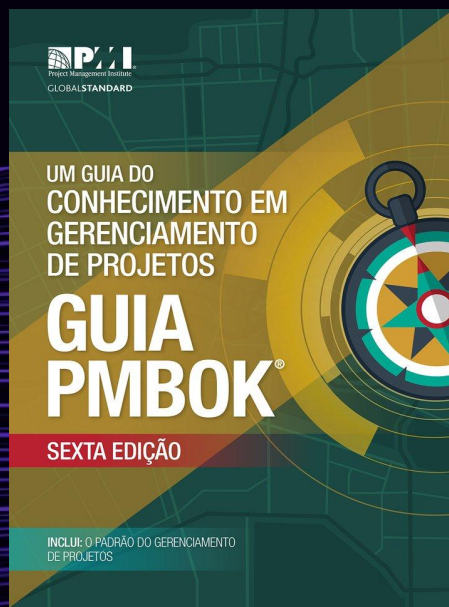


PMBOK® 6 (2017)

Projeto é o esforço temporário para criar algo novo e único, com um objetivo específico.

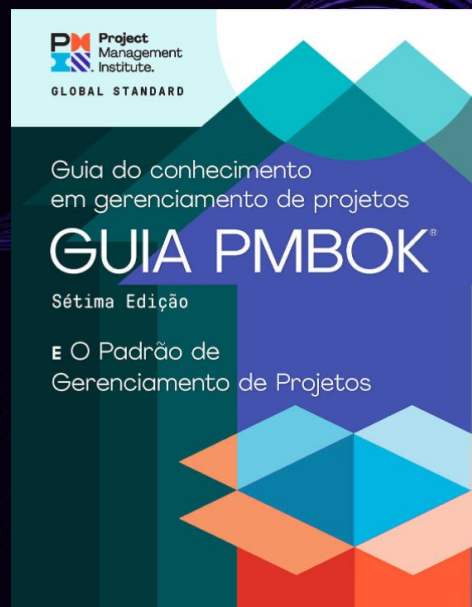

PMBOK® 7 (2021)

Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único.

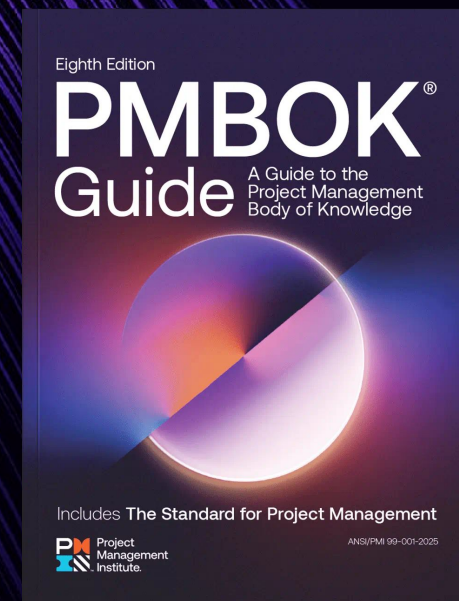



PMBOK® 8 (2025)

Projeto é uma iniciativa temporária, em um contexto único, realizada para criar **valor**.

Evolução de Áreas de Conhecimento para Domínios de Desempenho


PMBOK 6

- Integração
- Escopo
- Cronograma
- Custos
- Qualidade
- Recursos
- Comunicações
- Riscos
- Aquisições
- Partes Interessadas




PMBOK 7

- Partes Interessadas
- Equipe
- Ciclo de Vida
- Planejamento
- Trabalho do Projeto
- Entrega
- Medição
- Incerteza



PMBOK 8

- Governança
- Escopo
- Cronograma
- Finanças
- Partes Interessadas
- Recursos
- Riscos

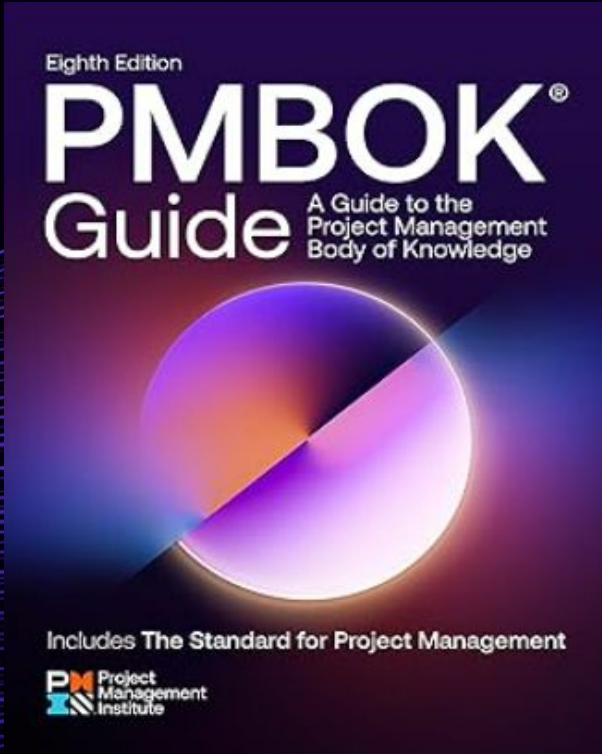


Guia PMBOK 8





Mentalidade Princípios Domínios de desempenho

NOVOS CONCEITOS

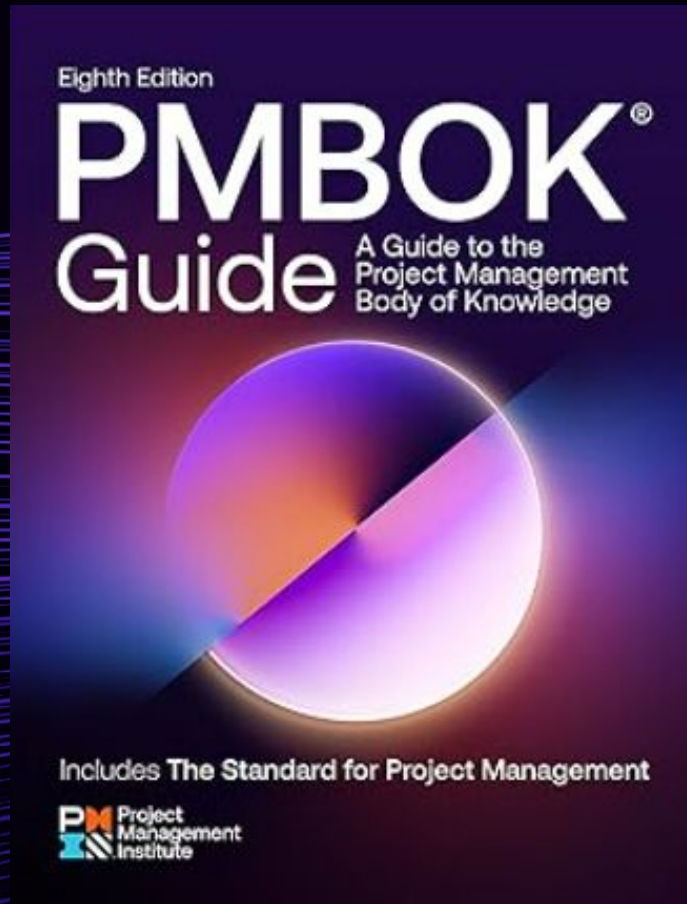

Guia PMBOK 8

Inclusão de novos conceitos tecnológicos como **Inteligência Artificial** como ferramentas / técnicas com foco em casos de uso e **Sustentabilidade**.

The background is a complex network of glowing blue and orange lines and dots, creating a sense of connectivity and data flow. The lines are thin and intersect to form a web-like structure. The dots are small and bright, serving as nodes in the network. The overall color palette is dominated by deep blues and vibrant oranges, with a dark background that makes the glowing elements stand out.

IA no PMBOK® 8



do projeto. Apoiar as pessoas durante a mudança e ajudar a resolver os obstáculos que podem impedir a equipe de alcançar o sucesso do projeto também deve fazer parte dessa função. Funções como gerentes de projeto, scrum masters, líderes de equipe, analistas de negócios e especialistas em gerenciamento de mudanças são exemplos de pessoas que normalmente desempenham essas funções de facilitação e apoio. Esse apoio pode incluir a avaliação do desempenho e o fornecimento de feedback aos indivíduos e às equipes do projeto para ajudá-los a aprender, adaptar-se e melhorar.

2.4.4 Executar o Trabalho

As pessoas que desempenham essa função fornecem o suporte necessário para entregar produtos e serviços. Algumas pessoas podem trabalhar em tempo integral ou parcial, dependendo dos fatores ambientais. Além disso, os projetos podem ser por agendamento ou por esforço fixo. Em alguns casos, os projetos podem ser realizados por membros da equipe do projeto, enquanto outros podem ser realizados por membros da equipe do projeto.

2.4.5 Aplicar Especialização

Aplicar a experiência em um projeto envolve contribuir com conhecimento especializado, visão

Licensed To: ANDERSON SALES PMI MemberID: 1530330
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos



de competências ao fluxo de trabalho do projeto. As equipes de gerenciamento do projeto eficazes criam oportunidades para que os indivíduos enfrentem desafios que ampliem suas habilidades e lhes forneçam feedback construtivo.


Além disso, ao promover uma cultura de melhoria contínua e prática reflexiva, a equipe de gerenciamento do projeto ajuda a garantir que as lições aprendidas sejam capturadas e compartilhadas, aumentando a experiência coletiva da equipe. Essa cultura do projeto e prepara os indivíduos para funções mais complexas assim a disciplina geral de gerenciamento de projetos.

2.5.1.3 Impacto Tecnológico no Gerenciamento de Projetos

Os avanços tecnológicos e gerenciadas. Além disso, a aplicação de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e outras tecnologias emergentes pode oferecer insights preditivos com base em dados históricos, ajudando a alocar recursos de forma eficaz e a melhorar a tomada de decisões com base em fatos, identificar riscos potenciais, relatar o progresso do projeto usando indicadores de antecipação e de atraso e otimizar as trajetórias do projeto. Essas tecnologias fornecem dados críticos sobre o desempenho da equipe e o gerenciamento financeiro, permitindo

Licensed To: ANDERSON SALES PMI MemberID: 1530330
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

O Padrão para Gerenciamento de Projetos

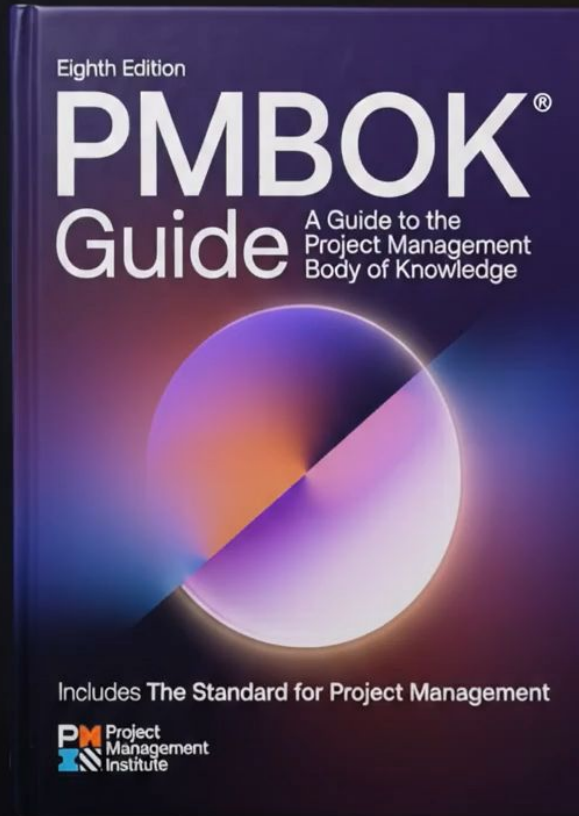

Estimar os Recursos

Entradas


- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Linha de base do escopo
- Documentos do projeto
 - Atributos da atividade
 - Lista de atividades
 - Registro de premissas
 - Estimativas de custo
 - Calendários de recursos
 - Registro de riscos
- Cronograma do projeto
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Estimativa ascendente
- Estimativa análoga
- Estimativa paramétrica
- Análise de dados
 - Análise alternativa
- Sistema de informações de gerenciamento de projetos
- Reuniões
- Coleta de dados
 - Entrevistas
- Inteligência artificial
- Análise preditiva
- Realidade virtual
- Realidade aumentada
- Ramificação e delimitação
- Algoritmos genéticos
- Modelo de custo construtivo
- Etc.

Saídas

- Requisitos de recursos
- Base das estimativas
- Estrutura analítica de recursos
- Atualizações de documentos do projeto
 - Atributos da atividade
 - Registro de premissas
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro de riscos
- Etc.

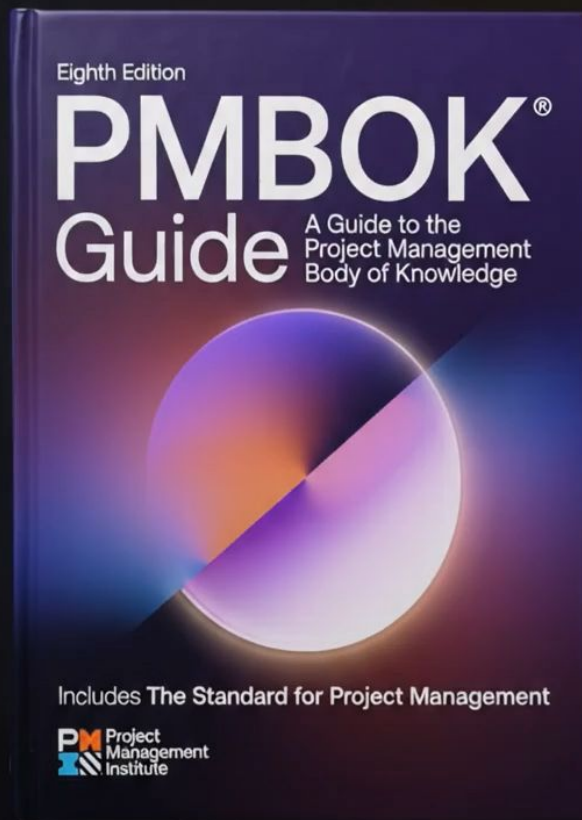

Identificar os Riscos

Entradas


- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de requisitos
 - Plano de gerenciamento do cronograma
 - Plano de gerenciamento financeiro
 - Plano de Gerenciamento da Qualidade
 - Plano de gerenciamento de recursos
 - Plano de gerenciamento de riscos
 - Linha de base do escopo
 - Linha de base do cronograma
 - Linha de base dos custos
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Estimativas de custo
 - Estimativas de duração
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
 - Documentação de requisitos
 - Requisitos de recursos
 - Registro das partes interessadas
- Acordos
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Coleta de dados
 - Brainstorming
 - Listas de verificação
 - Entrevistas
- Análise de dados
 - Análise de causa raiz
 - Análise de premissas e restrições
 - Análise SWOT
 - Análise de documentos
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Facilitação
- Listas de prompt
- Reuniões
- Inteligência artificial
- Etc.

Saídas

- Registro de riscos
- Relatório de riscos
- Atualizações de documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de questões
 - Registro de lições aprendidas
- Etc.

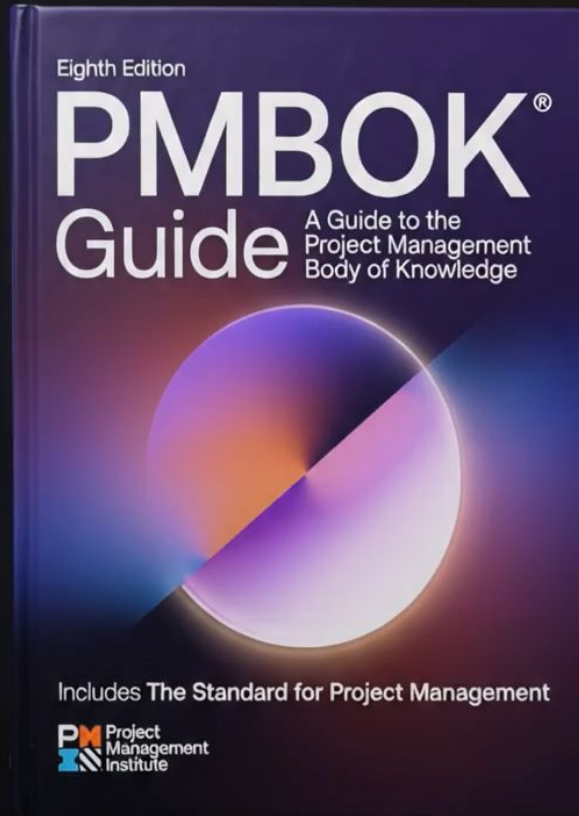

Elicitação e análise de requisitos

Entradas

- Termo de abertura do projeto
- Acordos
- Caso de negócio
- Documentos do projeto
 - Registro de premissas
 - Registro de lições aprendidas
 - Registro das partes interessadas
- Plano de gerenciamento do projeto
 - Plano de gerenciamento de requisitos
 - Plano de gerenciamento do escopo
- Fatores ambientais da organização
- Ativos de processos da organização
- Etc.

Ferramentas & Técnicas

- Julgamento especializado
- Tomada de decisão
- Coleta de dados
 - Benchmarking
 - Brainstorming
 - Grupos de discussão
 - Entrevistas
 - Questionários e pesquisas
- Análise de dados
 - Análise de documentos
- Representação de dados
- Habilidades interpessoais e de equipe
 - Grupo nominal
- Pensamento de design
- Priorização/classificação
- Reuniões
- Etc.

Saídas

- Documentação de requisitos
- Etc.

- Etc.



JUMP
PROFESSIONAL TRAINING

Anderson Sales

www.jumpeducacao.com.br

contato@jumpeducacao.com.br

(11) 98225-9645



Certificações

The PMP logo is centered in the image. It consists of the letters "PMP" in a bold, white, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®). The logo is enclosed within a white, rounded rectangular border. The background of the entire image is a dark blue gradient with flowing, wavy lines in a lighter blue shade, creating a sense of movement and depth.

PMP®

ATUALIZADO EM JULHO/2026

Números das Certificações PMI®



1.701.728



78.723



60.816



8.092

01/08/2026

Números das Certificações PMI®



JUMP
TREINAMENTO PROFISSIONAL



17.015



482



666



1.352

PMI-PMOCP + PMOCP

18/08/2026

Fonte: PMI Registry

The PMP logo is displayed inside a rounded rectangular frame with a thick black border. The text "PMP" is in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

PMP®

A maior certificação em Gerenciamento de projetos do mundo.

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO JUL/2026

O que estudar?

PMP®



Exam Content Outline


Project Management Professional (PMP)®




PM Project
Management
Institute.


**Resumo do
Conteúdo
do Exame**

Não é uma prova sobre um livro.

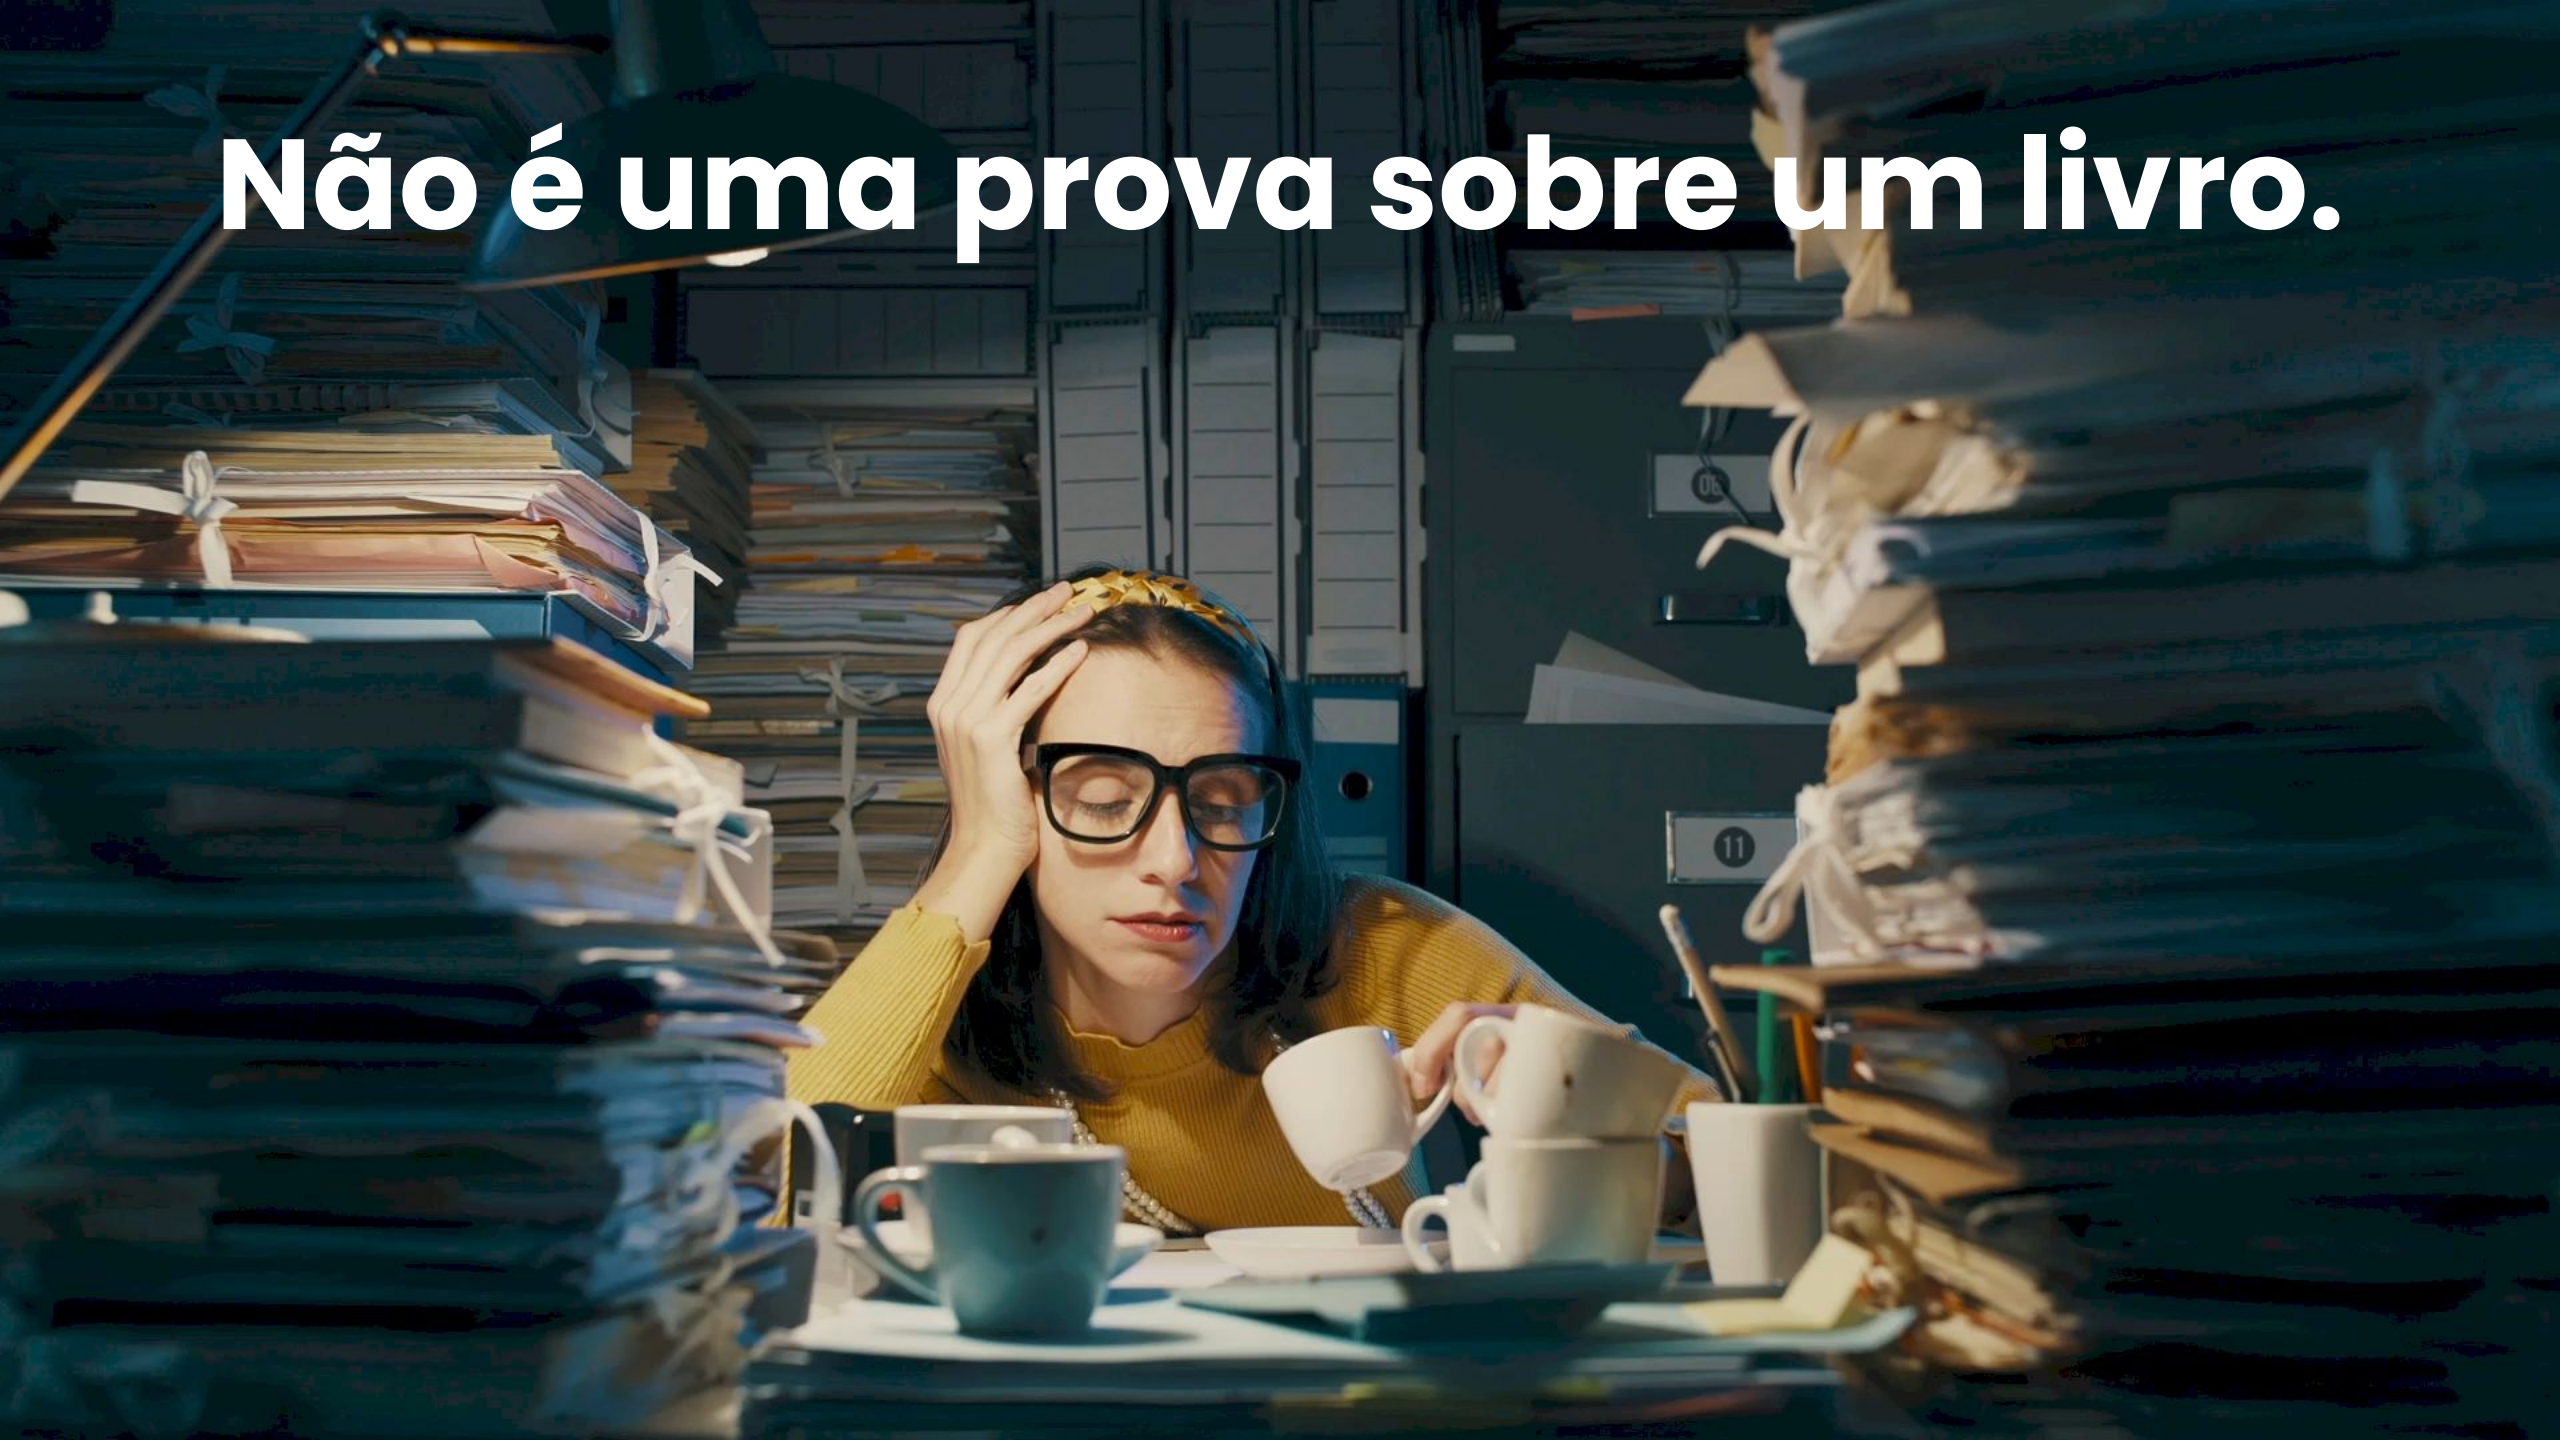

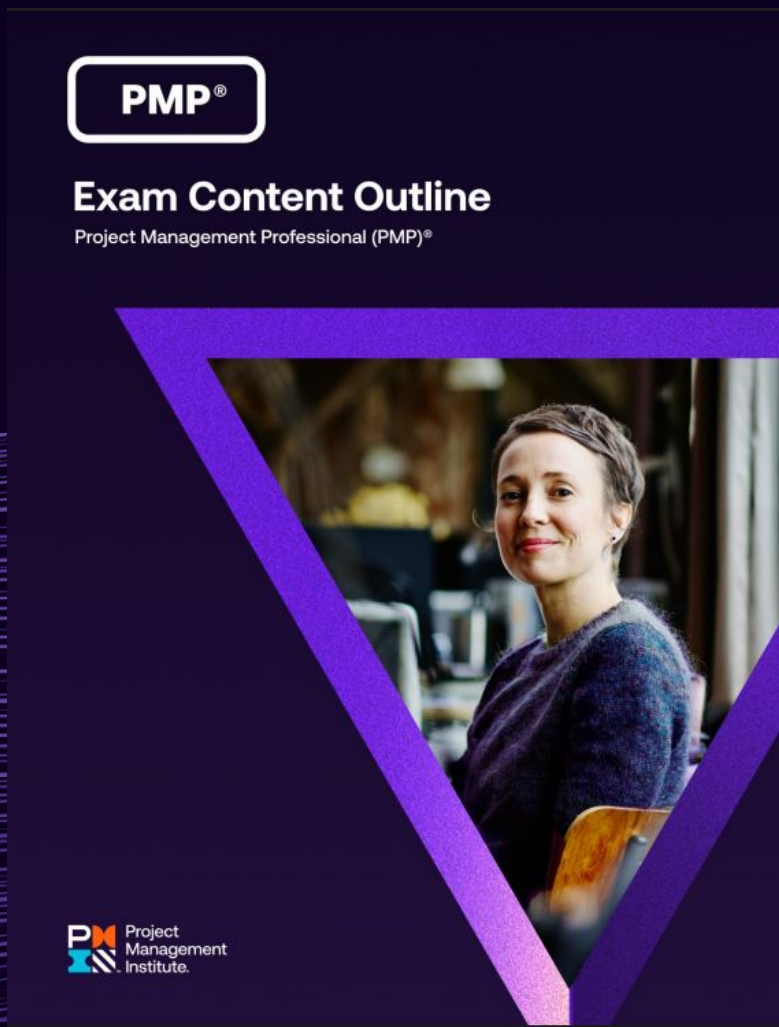

Conteúdo do
Exame

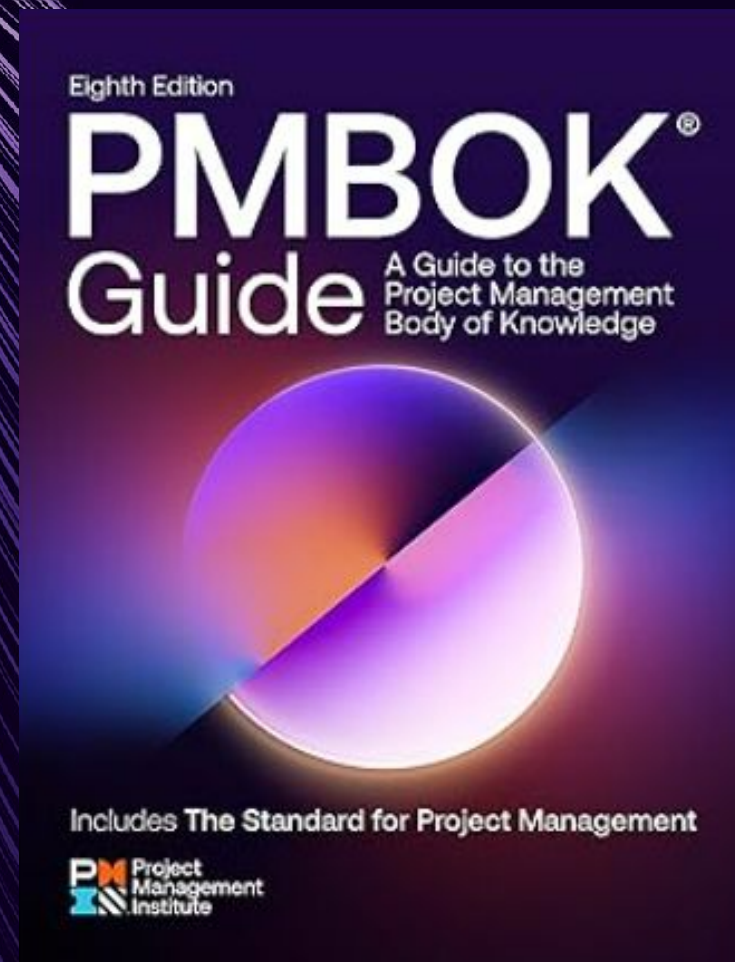

Conteúdo do
PMBOK

**Jul
2026**



Pessoas

33%
60 Questões

Processos

41%
73 Questões

**Ambiente
de negócios**

26%
47 Questões



PMP®

A partir de Julho de 2026
o exame PMP® passa a
ter **180 questões** e terá um
tempo total de **240**
minutos



PMP®

**A partir de Julho de 2026
o exame PMP® passa
a ter um Estudo de Caso**



PMP®

A partir de
julho de 2026
Adiciona tópicos como
IA, sustentabilidade e
engajamento das
partes interessadas.

Grupo com TUDO
sobre a Certificação





JUMP
PROFESSIONAL TRAINING

Anderson Sales

www.jumpeducacao.com.br

contato@jumpeducacao.com.br

(11) 98225-9645

REALIZAÇÃO



Project
Management
Institute.
Goiás, Brazil

PATROCINADOR



Project
Management
Institute.



